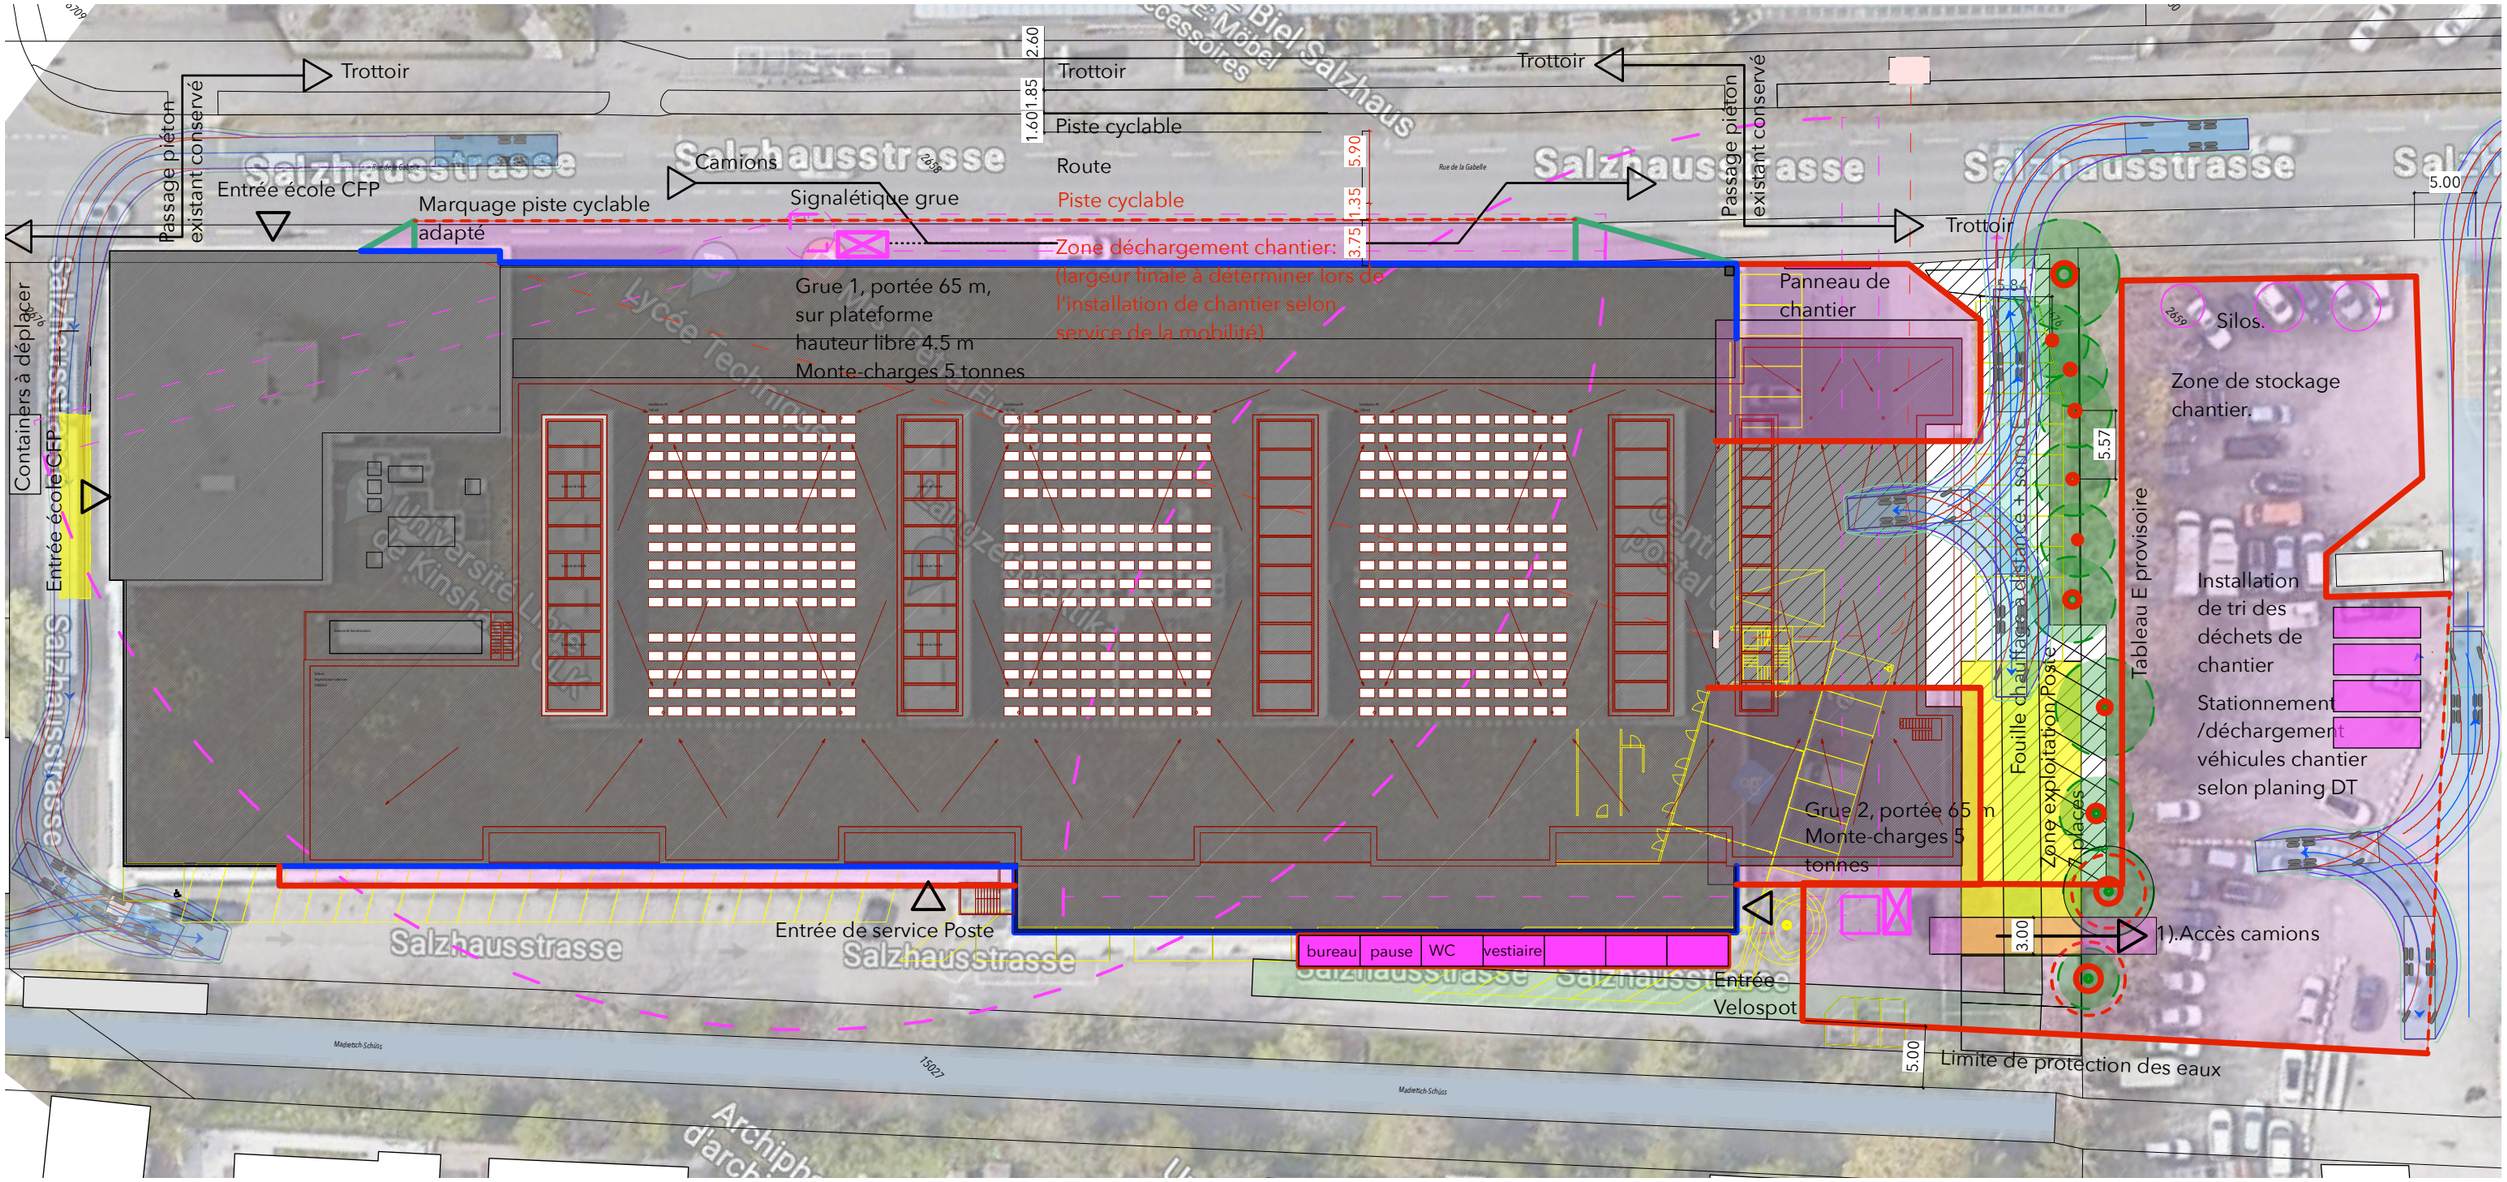

Installation de chantier

Phase de chantier:
. Zone installation de chantier concentrée, accès camion aisé depuis la rue de la Gabelle (gain de temps, sécurité).
. Pas de croisement entre camions chantier et camions Poste.
. Exploitation Poste et Velospot assurée durant la phase du chantier.
. Accès camion de pompier selon convention pompier.
. Accés garages Gabelle 10a assuré.
. Pas de survol habitations par les grues.

Phase de travaux anticipés:
. Exploitation Poste interrompue temporairement durant les travaux (CAD, pieux).
. Adaptations entrée Velospot.
. Empiettement domaine public, rue de la Gabelle avec adaptations du traffic.

PLAN D'ELIMINATION DES DECHETS
Principe d'éllimination:
. Elimination des déchets séparément, selon catégories de déchets et selon prescriptions OLED.
. Les déchets minéraux non pollués doivent être valorisés obligatoirement (revêtement de routes, béton, matériaux non triés).
. Les déchets "autre" non pollués sont valorisés (gypse, verre, bois, plastiques, métaux, isolation).
. Les déchets non triés sont réduits au strict minimum.

Coupe installation de chantier

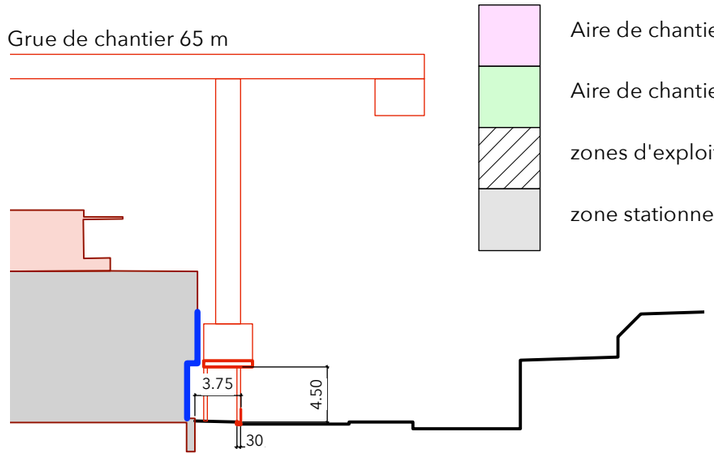

Légende

- Aire de chantier
- Aire de chantier temporaire
- zones d'exploitation Poste
- zone stationnement
- clôture de chantier h. 2.0 m
- clôture de chantier mobiles
- protection façade existante
- barrières de chantier h. 1.2 (rouge/blanc)
- protection arbres / protection racines

1).
Passage matériel camions:
.débroussaillage: LxH =3.0 x 3.5 m
. protection arbres 1.0 m
. protection racines 3.0 m
. remise en état parcelle 2659
. selon plan aménagement extérieurs



GEBERT ARCHITECTES

2207	**Gabelle**	Rue de la Gabelle 18 2503 Bienne Capvest Real Estate Switzerland Place Longemalle 7 1204 Genève
	Plan installation de chantier et gestion des déchets	
Phase: 31 Avant-projet Date: 28.09.2023	Plan No: 2207/31/230615 Gabelle_Plans.vwx Ech: 1:500	Format: A3 Des: ds

Gebert Architectes SA | Quai du Bas 31a Case postale 2501 Biel-Bienne | T. +41 32 346 50 60 | info@gebertarchitectes.ch www.gebertarchitectes.ch
